

8. ЦРКВА СВ. Ап. АНДРЕЈА, Подујево

Референтни бр.: RIC 11

Извођач: П.А.Б. (Ђаковица)

Период извођења: август 2007 - март 2008


Буџет: 209,454 евра

Црква Св. Апостола Андреја је тешко оштећена у пожару док је апсида срушена експлозијом у марту 2004. Звоник и оградни зид су тада комплетно срушени. Због изоловане локације цркве уследили су нови акти вандализма, тако да је објекат у више наврата био предмет бројних крађа материјала и провала. У току 2005., оградни зид и апсида су обновљени а црква заштићена и консолидована.

Детаљна обнова цркве је почела у лето 2007. и састојала се од унутрашњих и спољашњих поправки. До краја године већи део радова у цркви је завршен. Друга интервенција обухвата **обнову звоника** и она је започета у касну јесен 2007. год. Радови на звонику је предвиђено да буду завршени у току 2008. када ће бити комплетирани и унутрашњи радови у цркви.



Изглед цркве Св. Апостола Андреја након друге фазе обнове крајем 2007. год.

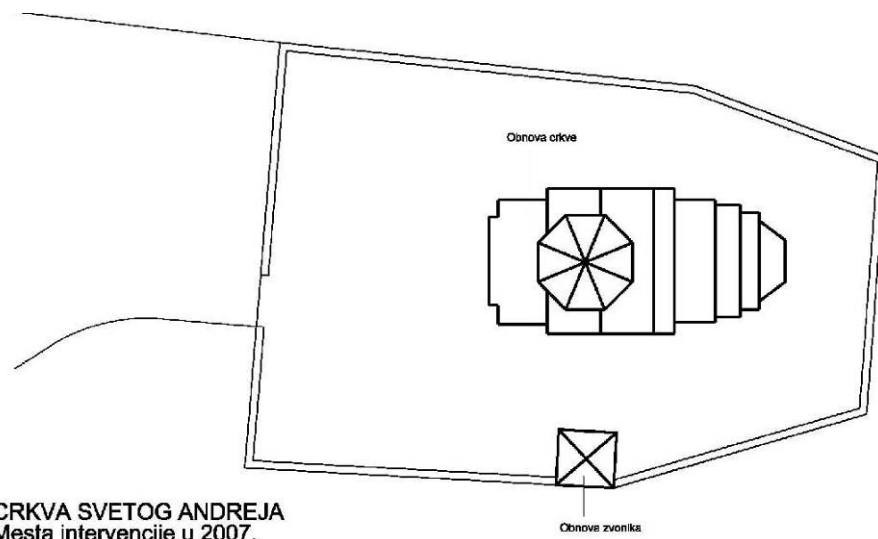

CRKVA SVETOG ANDREJA
Mesta intervencije u 2007.



Изглед цркве у лето 2004. год. пре почетка



Прва фаза радова на консолидацији и поправци апсиде 2005-2006. год.



Изглед цркве након друге фазе обнове, децембар 2007. год.

Унутрашњост цркве је најпре потпуно очишћена. Оштећени малтер је комплетно одстрањен укључујући и један преостали део са фрескама, које су неповратно уништене. Након тога, сви унутрашњи зидови и сводови су поново омалтерисани. Зидови апсиде, поново изграђени 2006. године су омалтерисани, споља и изнутра. Електрична инсталација је комплетно обновљена. Нови прикључак до градске мреже је обезбеђен постављањем бандера и ваздушних каблова. Постављена је и нова часна трпеза урађена од мермера. Пројекат за под је урађен као комбинација мермерних плоча у две различите боје. Споља су зидови консолидовани и окречени, кров је на местима где је покривач био оштећен или је недостајао комплетно поправљен оловним таблама. Гвоздени крст је направљен и постављен на куполу цркве.




Поређење: црква након уништења 2004. и крајем 2007. године



Радови у унутрашњости храма од 2004 до 2007. Крајем 2007. зидови су омалтерисани и предстоје финији и детаљнији радови у унутрашњости храма у току 2008. године.



Реконструкција новог звоника се ради на локацији на којој се налазио претходни објекат. Стари темељи су замењени новим бетонским темељима. Обнова конструкције се ради бетоном и циглом. Кровна конструкција ће бити дрвена, подашчана и покривена оловним покривачем. Зидови ће бити омалтерисани и окречени. Подови ће бити поплочани мермером а столарија је предвиђено да буде од храстовог дрвета. Израда и инсталација звона и гвозденог крста ће закључити ову интервенцију.



Детаљи

Почетак радова на звонику пресека звоника
